
DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2414-7
Conta corrente 7351-2 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 152 SOROCABA-CTO
Conta corrente (com DV) 3534200
CNPJ 59.734.921/0001-20
Nome favorecido COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.302
Valor 281.077,22
Destinação 0
Data transferência 03/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6319B8E3D8B0A7F2

Assinada por	JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	03/06/2024 14:50:29
	JD110496 REINALDO BESERRA DOS REIS	03/06/2024 15:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO BESERRA DOS REIS.

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 11:06:21

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1483 / U

Código de Verificação
o0ORDYNkW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
59.734.921/0001-20
Nome/Razão Social:
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA

Endereço: RUA JOAO MERCADO 260 ROSALIA-SANTA

Inscrição Municipal:
062291
E-mail:
financeiro@prohidro.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18095-010 (15) 3232-0035

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21
Nome/Razão Social:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 BAIRRO ALEM PONTE

Inscrição Municipal:
007618
E-mail:
contabilidade@santacasasorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-000 (15) 2101-8000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREDIO ONCOLOGIA - CONTRATO 001/2023 CONVÊNIO ESTADUAL 00122/2022-CP05600.23 - SANTA CASA - PREDIO ONCOLOGICO EM CONFORMIDADE COM SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 55/2013)
CNO 90.017.36634/70
VALOR MATERIAL : R\$153.594,10
VALOR MÃO DE OBRA R\$153.594,11
VALOR MEDIÇÃO R\$307.188,21
RETENÇÃO DE INSS (11% SOBRE 50% MÃO DE OBRA) R\$16.895,35 A SER RECOLHIDO PELA SANTA CASA
RETENÇÃO DE ISS (3% DE ISS SOBRE VALOR TOTAL R\$9.215,65 A SER RECOLHIDO PELA SANTA CASA
VALOR LÍQUIDO R\$ 281.077,21
VENCIMENTO: 10.06.2024
DEPOSITAR BANCO BRADESCO (237) AG 0152 C/C 353420-0

Debora Affonso
Engenharia
Irmãdada da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Raphael Pizzol
Gerência Predial
Irmãdada da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
307.188,21	0,00	0,00	307.188,21	3,000000	9.215,64

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9.215,64	0,00	0,00	0,00	16.895,35	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
307.188,21	26.110,99	0,00	281.077,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Obra: 365, Endereço: AVENIDA SAO PAULO, 750, BAIRRO ALEM PONTE, SOROCABA, SAO PAULO, 18013000, A



CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21
☎ (15) 2101-8000 🌐 www.santacasasorocaba.com.br 📱 Siga-nos: @santacasasorocaba

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Débora	Setor: Engenharia	Data: 03/06/2024
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: NF 1483 – COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): 2ª MEDIÇÃO OBRA PREDIO ONCOLÓGICO – BLOCO SÃO CAMILO		
3. Valor: R\$ 307.188,21		
4. Forma de pagamento: () Dinheiro () Boleto (X) Depósito - Banco: 237_ Agência: 0152 C/C: 353420-0 CNPJ: 59.734.921/0001-20		
5. Pagar com a verba: CONVENIO ESTADUAL 00122/2022		
6. Tipo de pagamento () Adiantamento (X) Prazo		
7. Data de pagamento: 03/06/2024		
8. Observações		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):  Raphael Pizzol Gerência Predial Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba  Soraya Trani F. da Silva Gerente Executivo Financeiro Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		

Recebi o valor de R\$ _____. Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 03 de junho de 2024.


Debora Afonso
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Solicitante (assinatura)

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)



PROHIDRO
CONSTRUTORA



Sorocaba, 22 de março de 2024.

A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA,
A/C Sr. Reinaldo Beserra dos Reis.

Ref.: 2ª Medição Contrato 353/23
Construção e Reforma do Prédio de Oncologia

A Comercial e Construtora **PROHIDRO** Ltda, vem apresentar a
2ª Medição referente ao período de 19/12/2023 a 20/03/2024 dos serviços de
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA DA IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA, na cidade de Sorocaba/SP.

RESUMO DA MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA - 2ª MEDIÇÃO	
a	VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 307.188,21
b	VALOR A FATURAR PELA PROHIDRO R\$ 307.188,21
c	DESCONTO RETENÇÃO INSS (11% sobre 50% de "b") R\$ 16.895,35
d	DESCONTO ISS (3% sobre "b") R\$ 15.359,41
VALOR LÍQUIDO A RECEBER DA 2ª MEDIÇÃO	
CONTRATO 001/2023 [CP05600.23-Santa Casa - Prédio Oncologia]	
(Em conformidade com Solução de Consulta Cosit nº 55/2013)	
	R\$ 274.933,45

Atenciosamente,

Amplio.

Rafael Pizzol
Gerente Geral
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba


Comercial e Construtora **PROHIDRO** Ltda
Engº Pedro Henrique Fermínio
Gerência de Engenharia e Novos Negócios

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

Rua João Mercado, 260 / Jd. Santa Rosália / Sorocaba-SP / CEP 13095-010 / Fone/Fax: (15) 3331-8484
www.prohidro.com



Construção e Reforma do Prédio de Oncologia



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	UNIT + BDI 25%	Preço Custo	TOTAL C/ BDI 25%	QTD	VALOR	VALOR	ACUMULADO
1	CUSTOS INDIRETOS					634.732,67		634.732,67		
1.1	Canleiro de Obra	m²	10,00	1.248,57	R\$	12.485,66	2,00	19.792,52	14,22%	191.525,52
1.1.1	Conteiner escavado 2,30x6,00m	m²	10,00	1.248,57	R\$	12.485,66	2,00	19.792,52	31,15%	38.060,17
1.1.2	Conteiner amovível 2,30x6,00m	m²	10,00	727,32	R\$	7.273,20	2,00	11.546,64	20,00%	59.606,81
1.1.4	Conteiner vaso sanitário 2,30x6,00m	m²	10,00	856,42	R\$	8.564,18	2,00	13.696,36	20,00%	73.303,17
1.1.6	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	33,33%	106.576,37
1.1.7	Colônia para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	118.489,37
1.1.8	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	119.519,74
1.1.9	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	120.731,94
1.1.10	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	121.641,09
1.1.11	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	122.853,29
1.1.12	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	123.762,44
1.1.13	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	124.974,64
1.1.14	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	126.005,01
1.1.15	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	137.918,01
1.1.16	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	145.191,21
1.1.17	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	157.104,21
1.1.18	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	158.134,58
1.1.19	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	159.346,78
1.1.20	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	160.255,93
1.1.21	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	161.468,13
1.1.22	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	162.377,28
1.1.23	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	163.589,48
1.1.24	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	164.619,85
1.1.25	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	176.532,85
1.1.26	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	183.806,05
1.1.27	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	195.719,05
1.1.28	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	196.749,42
1.1.29	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	197.961,62
1.1.30	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	200.050,77
1.1.31	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	201.262,97
1.1.32	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	202.172,12
1.1.33	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	203.384,32
1.1.34	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	204.414,69
1.1.35	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	216.327,69
1.1.36	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	223.600,89
1.1.37	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	235.513,89
1.1.38	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	236.544,26
1.1.39	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	237.756,46
1.1.40	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	238.665,61
1.1.41	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	239.877,81
1.1.42	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	240.786,96
1.1.43	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	242.000,16
1.1.44	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	243.030,53
1.1.45	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	254.943,53
1.1.46	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	262.216,73
1.1.47	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	274.129,73
1.1.48	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	275.160,10
1.1.49	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	276.372,30
1.1.50	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	277.281,45
1.1.51	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	278.493,65
1.1.52	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	279.402,80
1.1.53	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	280.615,00
1.1.54	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	281.645,37
1.1.55	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	293.558,37
1.1.56	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	300.831,57
1.1.57	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	312.744,57
1.1.58	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	313.774,94
1.1.59	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	314.987,14
1.1.60	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	315.896,29
1.1.61	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	317.108,49
1.1.62	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	318.017,64
1.1.63	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	319.229,84
1.1.64	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	320.260,21
1.1.65	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	332.173,21
1.1.66	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	339.446,41
1.1.67	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	351.359,41
1.1.68	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	352.389,78
1.1.69	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	353.601,98
1.1.70	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	354.511,13
1.1.71	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	355.723,33
1.1.72	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	356.632,48
1.1.73	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	357.844,68
1.1.74	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	358.875,05
1.1.75	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	370.788,05
1.1.76	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	378.061,25
1.1.77	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	390.000,25
1.1.78	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	391.030,62
1.1.79	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	392.242,82
1.1.80	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	393.151,97
1.1.81	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	394.364,17
1.1.82	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	395.273,32
1.1.83	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	396.485,52
1.1.84	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	397.515,89
1.1.85	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	409.428,89
1.1.86	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	416.702,09
1.1.87	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	428.615,09
1.1.88	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	429.645,46
1.1.89	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	430.857,66
1.1.90	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	431.766,81
1.1.91	Móveis de escritório	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	432.979,01
1.1.92	PCMAT / PGR	un	1,00	909,15	R\$	909,15	1,00	909,15	100,00%	433.888,16
1.1.93	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	435.100,36
1.1.94	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	436.130,73
1.1.95	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	448.043,73
1.1.96	Frete para contêineres (entrega / retirada) para Sorocaba	un	6,00	606,10	R\$	3.636,60	2,00	7.273,20	100,00%	455.316,93
1.1.97	Colônias para refeitório (sem paredes)	m²	20,00	595,65	R\$	11.913,00	20,00	11.913,00	100,00%	467.229,93
1.1.98	Refeitório	un	1,00	1.030,37	R\$	1.030,37	1,00	1.030,37	100,00%	468.260,30
1.1.99	Placa de obra	un	1,00	1.212,20	R\$	1.212,20	1,00	1.212,20	100,00%	469.472,50
1.2	Instalações provisórias	un	5,00	794,48	R\$	3.972,38				
1.2.1	Ligação provisória de energia elétrica	un	1,00	2.424,40	R\$	2.424,40				
1.2.2	Ligação provisória de energia elétrica	un	1,00	6.061,00	R\$	6.061,00				
1.2.3	Proteções e Equipamentos	un	1,00	2.424,40	R\$	2.424,40				
1.2.4	Isol									

1.5.7	EPs	mês	10,00	R\$	1.598,26	R\$	15.982,55	2,00	R\$	3.196,53	20,00%	R\$	4.794,77	30,00%
1.5.8	Primeiros socorros	vb	1,00	R\$	909,15	R\$	909,15		R\$	909,15	100,00%	R\$	909,15	100,00%
1.5.9	Materiais de limpeza	mês	10,00	R\$	227,29	R\$	2.272,80	2,00	R\$	454,58	20,00%	R\$	681,86	30,00%
1.7	Máquinas e Equipamentos					R\$	104.912,80		R\$	9.982,74	9,57%	R\$	12.110,19	11,61%
1.7.1	Retro escavadeira	mês	10,00	R\$	2.127,45	R\$	21.274,50	2,00	R\$	4.254,90	20,00%	R\$	6.382,35	30,00%
1.7.2	Rolo compactador	mês	10,00	R\$	2.575,99	R\$	25.759,90		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
1.7.3	RTA	mês	10,00	R\$	5.727,84	R\$	57.278,40	1,00	R\$	5.727,84	10,00%	R\$	5.727,84	10,00%
1.9	IMPOSTOS					R\$	2.424,40		R\$	-	0,00%	R\$	2.424,40	100,00%
1.9.1	ART - Obra	vb	1,00	R\$	1.212,20	R\$	1.212,20		R\$	-	0,00%	R\$	1.212,20	100,00%
1.9.2	ART - Projetos	vb	1,00	R\$	1.212,20	R\$	1.212,20		R\$	-	0,00%	R\$	1.212,20	100,00%
1.10	Diversos					R\$	38.668,63		R\$	-	0,00%	R\$	38.668,63	94,05%
1.10.1	Seguro - Riscos de Engenharia	vb	1,00	R\$	36.366,00	R\$	36.366,00		R\$	-	0,00%	R\$	36.366,00	100,00%
1.10.2	Data book	vb	1,00	R\$	2.302,63	R\$	2.302,63		R\$	-	0,00%	R\$	2.302,63	100,00%
3	TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DA OBRA					R\$	19.251,47		R\$	7.500,00	38,96%	R\$	19.251,47	100,00%
3.1	Terraplanagem com compactação do solo	m²	387,00	R\$	27,00	R\$	10.449,00		R\$	-	0,00%	R\$	10.449,00	100,00%
3.2	Acompanhamento de topógrafo	vb	1,00	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00	1,00	R\$	7.500,00	100,00%	R\$	7.500,00	100,00%
3.3	Locação da obra	m²	387,00	R\$	3,37	R\$	1.302,47		R\$	-	0,00%	R\$	1.302,47	100,00%
4	FUNDAÇÕES PROFUNDAS					R\$	319.470,48		R\$	183.802,67	57,53%	R\$	183.802,67	57,53%
4.1	Mobilização de equipamentos escavação de tubulão	vb	1,00	R\$	5.400,00	R\$	5.400,00	1,00	R\$	5.400,00	100,00%	R\$	5.400,00	100,00%
4.2	Tubulão Manual e alargamento das bases	m³	123,43	R\$	1.013,50	R\$	124.972,88	104,12	R\$	105.421,50	84,36%	R\$	105.421,50	84,36%
4.3	Encamamento dos tubulões com anéis de concreto	m	106,00	R\$	202,50	R\$	21.465,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
4.4	Concreto fck 25MPa, com consumo de 300kg de cimento/m³	m³	116,03	R\$	675,00	R\$	78.322,86		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
4.5	Armadura de aço CA50/60	kg	3134,20	R\$	14,85	R\$	46.542,85	3134,20	R\$	46.542,87	100,00%	R\$	46.542,87	100,00%
4.6	Arrasamento e preparo de estaca	un	20,00	R\$	270,00	R\$	5.400,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
4.7	Remoção do solo removido	m³	160,46	R\$	232,88	R\$	37.366,09	113,53	R\$	26.436,30	70,75%	R\$	26.436,30	70,75%
5	INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS BALDRAMES					R\$	255.977,01		R\$	25.613,28	10,02%	R\$	25.613,28	10,02%
5.1	Escavação com acerto manual	m³	217,26	R\$	108,00	R\$	23.463,78		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.2	Compactação manual de fundo de valas	m²	215,89	R\$	10,80	R\$	2.331,62		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.3	Leitro de concreto magro sobre blocos (5cm)	m²	4,19	R\$	1.013,31	R\$	4.248,54		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.4	Leitro de brita sobre vigas baldrames (5cm)	m²	7,83	R\$	252,99	R\$	1.980,85		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.5	Forma + desforma comum	m²	407,39	R\$	156,91	R\$	63.924,24		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.6	Concreto fck 25MPa, com consumo de 300kg de cimento/m³	m³	66,70	R\$	675,00	R\$	45.025,54		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.7	Armadura de aço CA50/60	kg	3377,79	R\$	14,85	R\$	50.160,18	1724,80	R\$	25.613,28	51,06%	R\$	25.613,28	51,06%
5.8	Relevo compactado de cava	m³	163,03	R\$	81,00	R\$	13.205,43		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.9	Remoção do solo removido	m³	86,72	R\$	232,88	R\$	20.195,35		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.10	Impermeabilização de baldrame com argamassa polimérica	m²	302,87	R\$	76,42	R\$	23.146,16		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
5.11	Avenaria de embasamento	m²	50,53	R\$	156,26	R\$	7.895,32		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
6	LAJE PISO - SUBSOLO					R\$	30.294,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
6.1	Laje de espessura h= 36 acabada	m²	110,00	R\$	147,15	R\$	16.186,50		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
6.2	Capoteamento da laje (5 cm)	m²	110,00	R\$	128,25	R\$	14.107,50		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7	SUPERESTRUTURA					R\$	1.058.844,36		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.1	PILARES E VIGAS					R\$	298.153,90		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.1.1	Forma + desforma comum (Com reaproveitamento - 3 usos) com Chapa Compensada Plastificada	m²	650,85	R\$	156,91	R\$	102.125,37		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.1.2	Concreto fck 40MPa, com consumo de 300kg de cimento/m³	m³	101,19	R\$	685,80	R\$	69.397,54		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%

7.1.2

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
em FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
do Estado de São Paulo
Grupo de Despesa: 445042

7.1.3	Armadura de aço CA50/60	kg	7541,03	R\$	14,85	R\$	111.984,30		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.1.4	Cimbramento de estrutura	vb	1,00	R\$	14.646,70	R\$	14.646,70		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2	LAJES								R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2.1	LAJES PROTENDIDAS					R\$	760.690,46		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2.1.1	Lajes Protendidas	vb	1,00	R\$	162.910,47	R\$	162.910,47		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2.1.2	Cordão de laje (Para as respectivas 5 lajes)	und.	5,00	R\$	23.783,61	R\$	118.918,06		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2.1.3	Forma + desforma da laje (locação de 3 jogos de formas Planex 600 x 600)	vb	1,00	R\$	31.201,20	R\$	31.201,20		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2.1.4	Concreto fck 40 MPa, com consumo de 300kg de cimento/m³	m³	469,57	R\$	685,80	R\$	322.029,73		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
7.2.1.5	Cimbramento de estrutura	vb	1,00	R\$	125.631,00	R\$	125.631,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8	COBERTURA METÁLICA					R\$	372.978,63		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8.1	Remoção da cobertura existente no primeiro pavimento (12,05 X 30,49 m)	vb	1,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8.2	Bota-fora do material proveniente da remoção da cobertura	m³	73,48	R\$	215,63	R\$	15.844,32		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
8.3	Estrutura metálica de cobertura (Total de 708 m²)	m²	1,00	R\$	332.134,31	R\$	332.134,31		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
9	ALVENARIAS E FECHAMENTOS					R\$	287.666,88		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
9.1	Alvenaria de bloco de vedação 14x19x39cm	m²	1500,33	R\$	123,65	R\$	185.510,44		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
9.2	Canaleta em alvenaria de bloco de vedação 14x19x39cm	m	1802,13	R\$	56,69	R\$	102.156,44		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10	REVESTIMENTOS					R\$	838.569,89		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.1	PISO					R\$	175.744,86		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.1.1	Regularização do contrapiso para assentamento de revestimento (Ate 2,5cm)	m²	1497,00	R\$	40,88	R\$	61.194,37		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.1.2	Porcelanato Retificado Portinari Veneza BE HARD 90X90 e rodapé 10cm	m²	151,52	R\$	587,25	R\$	88.977,89		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.1.3	Porcelanato Retificado Portinari Veneza BE NAT 90X90 e rodapé 10cm (dentro do box)	m²	42,57	R\$	600,75	R\$	25.572,61		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.2	PAREDES					R\$	372.201,03		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.2.1	Chapisco	m²	3870,64	R\$	9,03	R\$	34.957,72		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.2.2	Emboço	m²	3870,64	R\$	46,94	R\$	181.686,08		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.2.3	Revestimento VIA ROSA ROX 31x58 Monoporoso Retificado - Branco	m²	921,82	R\$	168,75	R\$	155.557,24		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.3	TETO					R\$	90.624,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.3.1	Forro em gesso cartonado em Placa RU - 12,5 mm	m²	50,00	R\$	115,20	R\$	5.760,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
10.3.2	Forro em gesso cartonado em Placa ST - 12,5 mm	m²	780,00	R\$	108,80	R\$	84.864,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
12	PORTAS DE MADEIRA COM BATENTES METÁLICOS					R\$	221.360,84		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
12.1	P1 - Porta de madeira de correr 1,20 x 2,10, acabamento da folha em revestimento melamínico cor branca, com roldanas, incluso trilho, fechadura e puxador	un	3,00	R\$	3.840,00	R\$	11.520,00		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
12.2	P2 - Porta de madeira de giro 1,20 x 2,10 com batentes metálicos e acabamento da folha em revestimento melamínico cor branca, incluso guarnições, dobradiças e fechadura.	un	33,00	R\$	3.806,72	R\$	125.621,76		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
12.3	P3 - Porta de madeira de giro 0,80 x 2,10 com batentes metálicos e acabamento da folha em revestimento melamínico cor branca, incluso guarnições, dobradiças e fechadura.	un	23,00	R\$	3.473,92	R\$	79.900,16		R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%

7.1.2

7th. 1844.

12.4	P4 - Porta de madeira de giro Ø 70 X 2,10 com batentes metálicos e acabamento da folha em revestimento melamínico cor branco, incluso puxador, dobradiças e fechadura.	un	1,00	R\$	4.318,72	R\$	4.318,72	R\$	1,153.923,05	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14	INSTALAÇÕES															
14.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS															
14.1.1	Infraestrutura hidráulica para água fria e esgoto	vb	1,00	R\$	289.561,60	R\$	289.561,60	R\$	289.561,60	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2	LOUÇAS E METAIS															
14.1.2.1	Bacia para Caixa Acoplada IXT Conforto - BR 9115 DECA	un	26,00	R\$	31.689,32	R\$	31.689,32	R\$	31.689,32	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.2	Caixa Acoplada com EIXO IXT Conforto - BR - C00007 - DECA	un	26,00	R\$	793,59	R\$	793,59	R\$	20.633,27	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.3	Assento Plástico Universal AP 01 Branco Celio - IE - DECA	un	26,00	R\$	116,47	R\$	116,47	R\$	3.028,27	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.4	Lavatório 55X355mm V Plus x/aspem Branco - CS10 - DECA	un	26,00	R\$	415,30	R\$	415,30	R\$	10.795,20	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.5	Coluna Suspense para Lavatório V Plus Branco - CS10 - DECA	un	26,00	R\$	391,68	R\$	391,68	R\$	10.183,68	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.6	Torçã de Fechamento Automático PRESMÁTICO COMPACT - DOCCOL	un	26,00	R\$	322,07	R\$	322,07	R\$	8.373,73	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.7	Ducha Hidráulica com registro e derivação com ganho Chrome - DOCCOL	un	26,00	R\$	434,86	R\$	434,86	R\$	11.306,36	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.8	Chuveiro Correntetti Tradicional e Temperaturas 220V 6,800W	un	24,00	R\$	343,85	R\$	343,85	R\$	8.252,45	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.9	Raio Quente em ABS 15cm X 15 cm X 4,5 cm - Bepi Astra	un	50,00	R\$	155,22	R\$	155,22	R\$	7.761,10	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.10	Banco Articulado para Banho em inox 45 X 70	un	7,00	R\$	864,80	R\$	864,80	R\$	5.997,60	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.12	Barras de apoio de Inoxidável 40x60	un	10,00	R\$	364,00	R\$	364,00	R\$	3.640,00	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.13	Barras de apoio para Dm1 22 Barras T001 - Branco - DECA	un	8,00	R\$	581,47	R\$	581,47	R\$	4.651,76	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.1.2.14	Instaleções elétricas, de iluminação e SPDA	vb	1,00	R\$	376.960,00	R\$	376.960,00	R\$	46.123,41	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
14.2.1	Instaleções elétricas, de iluminação e SPDA	vb	1,00	R\$	376.960,00	R\$	376.960,00	R\$	46.123,41	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.3	LUMINÁRIAS															
14.3.2	Luminares retangulares 1250x200mm equipadas com lâmpadas LED 2 X 18W - 4000K, difusor transparente, fonte de alimentação 127V - 60Hz, FP>0,92, acabamento cor branco	un	92,00	R\$	394,24	R\$	394,24	R\$	36.270,08	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.3.3	Luminares painel Platon quadrado equipadas com lâmpada LED 24W - 6000K, fonte de alimentação 127V - 60Hz, FP>0,92, acabamento cor branco	un	4,00	R\$	104,19	R\$	104,19	R\$	416,77	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.3.4	Luminares painel Platon quadrado equipadas com lâmpada LED 18W - 6000K, fonte de alimentação 127V - 60Hz, FP>0,92, acabamento cor branco	un	66,00	R\$	61,95	R\$	61,95	R\$	4.088,83	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%
14.3.5	Luminares tipo arandelas de sobregrupos equipadas com lâmpada LED 15W, fonte de alimentação 127V - 60Hz, FP>0,92	un	58,00	R\$	92,24	R\$	92,24	R\$	5.349,73	R\$	-	-	0,00%	R\$	0,00%	0,00%

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Container escritório 2,30x6,00m	UNIDADE x MÊS	
PLANILHA			
1.1.1			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Container escritório 2,30x6,00m	18/12/23 à 20/03/24	2,00
		MESES	2,00
CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Construção e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042			
		TOTAL:	2,00
OBSERVAÇÃO		UNIDADE x MÊS	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		FISCALIZAÇÃO	

Raphael Pizzol
Gerente Prohidro
Instituição de Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Container almoxarifado 2,30x6,00m	UNIDADE x MÊS	
PLANILHA			
1.1.2			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Container almoxarifado 2,30x6,00m	18/12/23 à 20/03/24	2,00
		MESES	2,00
		TOTAL:	2,00
OBSERVAÇÃO		UNIDADE x MÊS	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		FISCALIZAÇÃO	

Raphael Pizzol
Gerente Prohidro
Instituição de Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Container vaso sanitário 2,30x6,00m	UNIDADE x MÊS	
PLANILHA			
1.1.4			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Container vaso sanitário 2,30x6,00m	18/12/23 à 20/03/24	2,00
		MESES	2,00
CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Construção e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090296 Grupo de Despesa: 445042			
OBSERVAÇÃO		TOTAL: 2,00	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023		UNIDADE x MÊS	
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO		FISCALIZAÇÃO	
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		Raphael Pizzol	
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		Gerente Prohidro	

Grupo de Despesa: 445042
 UGE pagadora: 090296
 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 de 49 Leitos Oncológicos
 Investimento na Construção e Reforma
 CONVÊNIO - 122/2022

Raphael Pizzol
 Gerente Prohidro
 Irmandade do Santo Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Frete para containers (entrega / retirada) para Sorocaba	UNIDADE x MÊS	
PLANILHA			
1.1.6			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Frete para containers (entrega / retirada) para Sorocaba	18/12/23 à 20/03/24	2,00
		MESES	2,00
OBSERVAÇÃO			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023		UNIDADE x MÊS	
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO		FISCALIZAÇÃO	
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		Raphael Pizzol	
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		Gerente Prohidro	

Raphael Pizzol
 Gerente Prohidro
 Irmandade do Santo Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

CONVÊNIO - 122/2022
investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 045042
MEMÓRIA DE CÁLCULO
 Comercial e Construtora Prohidro LTDA
 CNPJ : 59.734.921/0001-20

		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916	
		CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Cobertura para refeitório (sem paredes)	m²	
PLANILHA			
1.1.7			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Cobertura para refeitório (sem paredes)	18/12/23 a 20/03/24	20,00
Cópia de projeto aprovado para execução de obra FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE de 49 leitos Oncológicos investimento em construção e reforma CONVÊNIO - 122/2022			
		TOTAL:	20,00
OBSERVAÇÃO			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO		FISCALIZAÇÃO	
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		Raphael Pizzol	
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		Imendência de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba	

Raphael Pizzol
 Gerente Geral
 Imendência de Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916	
		CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Bebedouros	UNIDADE	
PLANILHA			
1.1.11			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Bebedouros	18/12/23 a 20/03/24	1,00
		TOTAL:	1,00
OBSERVAÇÃO			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO		FISCALIZAÇÃO	
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		Raphael Pizzol	
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		Imendência de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba	

Raphael Pizzol
 Gerente Geral
 Imendência de Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1. CUSTOS INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Extintores	VB	
PLANILHA			
1.1.14			
LOCAÇÃO	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
1	Extintores	18/12/23 à 20/03/24	1,00
CONVENIO - 122/2022 Grupo de Trabalho de Assistência de Saúde em Oncologia			
TOTAL:			1,00
OBSERVAÇÃO		UNIDADE x MÊS	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024			
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			
FISCALIZAÇÃO			

Raphael Pizzol
 Cirurgião Plástico
 Irmandade de Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1.3. PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Ferramentas de obra uso geral	UNIDADE x MÊS	
PLANILHA			
1.3.23			
LOCAL	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE
OBRA	Ferramentas de obra uso geral	18/12/23 à 20/03/24	2,00
CONVENIO - 122/2022 Grupo de Trabalho de Assistência de Saúde em Oncologia			
TOTAL:			2,00
OBSERVAÇÃO		UNIDADE x MÊS	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024			
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			
FISCALIZAÇÃO			

Raphael Pizzol
 Cirurgião Plástico
 Irmandade de Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1.4.EQUIPE TÉCNICA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Engenheiro Civil	MÊS	
PLANILHA			
1.4.1			
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	REF. TOTAL
1	Engenheiro Civil	18/12/23 à 20/03/24	2,00 2,00
CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Construção e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042			
		TOTAL:	2,00
OBSERVAÇÃO		MES	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		FISCALIZAÇÃO T. Mello	
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			

Raphael Pizzol
Gerente Geral
Imunidade do Santa Casa da
Misericórdia de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
1.4.EQUIPE TÉCNICA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
1	Técnico de Segurança	MÊS	
PLANILHA			
1.4.2			
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	REF. TOTAL
1	Técnico de Segurança	18/12/23 à 20/03/24	2,00 2,00
		TOTAL:	2,00
OBSERVAÇÃO		MES	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA 21/03/24	
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		FISCALIZAÇÃO T. Mello	
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			

Raphael Pizzol
Gerente Geral
Imunidade do Santa Casa da
Misericórdia de Sorocaba

MEMÓRIA DE CALCULO		PROCESSO Nº		
Comercial e Construtora Prohidro LTDA		SES-PRC-2022/001916		
CNPJ : 59.734.921/0001-20		CONCORRENCIA Nº		
		001/2023		
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA				
1.5.CONSUMOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE		
1	Internet	MÊS		
PLANILHA				
1.5.4				
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	REF.	TOTAL
1	Internet	18/12/23 à 20/03/24	2,00	2,00
CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Construção e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042				
TOTAL:				2,00
OBSERVAÇÃO				MES
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023				
CONTRATO Nº 001/2023				
VISTO/DATA 20/03/2024				
CONSTRUTORA PROHIDRO				
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS				
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916				

Raphael Pizol
Gerente Geral
Irmão de Casa de
Misericórdia de Sorocaba

MEMÓRIA DE CALCULO		PROCESSO Nº		
Comercial e Construtora Prohidro LTDA		SES-PRC-2022/001916		
CNPJ : 59.734.921/0001-20		CONCORRENCIA Nº		
		001/2023		
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA				
1.5.CONSUMOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE		
1	Materiais de Escritório	MÊS		
PLANILHA				
1.5.5				
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	REF.	TOTAL
1	Materiais de Escritório	18/12/23 à 20/03/24	2,00	2,00
OBSERVAÇÃO				MES
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023				
CONTRATO Nº 001/2023				
VISTO/DATA 20/03/2024				
CONSTRUTORA PROHIDRO				
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS				
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916				

Raphael Pizol
Gerente Geral
Irmão de Casa de
Misericórdia de Sorocaba

**Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

UGF pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042		MEMÓRIA DE CÉLCULO Comercial e Construtora Prohldro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
PROHIDRO CONSTRUTORA					
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA					
1.5.CONSUMOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNIDADE	
1	Materiais de Limpeza			MÊS	
PLANILHA					
1.5.9					
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	REF.	TOTAL	
1	Materiais de Limpeza	18/12/23 a 20/03/24	2,00	2,00	
OBSERVAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 001/2023 VISTO/DATA 22/03/24 CONSTRUTORA PROHIDRO ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			TOTAL: 2,00 MÊS		
VISTO/DATA 22/03/24 FISCALIZAÇÃO			7m2b.		

 PROHIDRO CONSTRUTORA	MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20	PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023
	OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA	
	1.7. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE
1		
PLANILHA	Retro Escavadeira	MÊS
1.7.1		

ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	QTDE	MESES
1	Retro Escavadeira	18/12/23 à 20/03/24	2,00	2,00

			TOTAL:	2,00
--	--	--	---------------	-------------

OBSERVAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 001/2023 VISTO/DATA 20/03/2024 CONSTRUTORA PROHIDRO ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916	21/03/24 VISTO/DATA FISCALIZAÇÃO
--	---

Raphael Pizzoi
Gerência Predial
Irmãzinha da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Raphael Pizzol
Cedente Profael
Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

CONVÊNIO - 122/2023
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
4. FUNDAÇÕES PROFUNDAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
4			
PLANILHA			
4.1	Mobilização de equipamentos escavação de tubulão	VB	
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL
1	Mobilização de equipamentos escavação de tubulão	18/12/23 à 20/03/24	1,00
TOTAL: 1,00			
OBSERVAÇÃO			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024			
CONSTRUTORA PROHIDRO			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023																																																	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA																																																			
4.FUNDAÇÕES PROFUNDAS																																																			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE																																																	
4																																																			
PLANILHA																																																			
4.2	Tubulão Manual e alargamento das bases	M3																																																	
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL																																																
1	Tubulão Manual e alargamento das bases	18/12/23 à 20/03/24	104,12																																																
Volume para escavação do tubulão Vol = Diâmetro x Altura do tubulão Fuste de 90 cm Vol = 0,9 x 6,4 = 5,76 m3 Fuste de 120 cm Vol = 1,2 x 6,4 = 7,68 m3																																																			
<table><thead><tr><th>Peca</th><th>Volume escavado</th><th>Abertura de Bases</th></tr></thead><tbody><tr><td>tubulão 1</td><td>5,76</td><td>0,19</td></tr><tr><td>tubulão 2</td><td>5,76</td><td>0,89</td></tr><tr><td>tubulão 5</td><td>5,76</td><td>3,99</td></tr><tr><td>tubulão 7</td><td>5,76</td><td>1,93</td></tr><tr><td>tubulão 8</td><td>7,68</td><td>4,75</td></tr><tr><td>tubulão 11</td><td>5,76</td><td>3,48</td></tr><tr><td>tubulão 12</td><td>5,76</td><td>0,89</td></tr><tr><td>tubulão 14</td><td>5,76</td><td>1,12</td></tr><tr><td>tubulão 15</td><td>5,76</td><td>0,06</td></tr><tr><td>tubulão 20-A</td><td>5,76</td><td>0,89</td></tr><tr><td>tubulão 20-B</td><td>5,76</td><td>0,89</td></tr><tr><td>tubulão 22</td><td>5,76</td><td>0,41</td></tr><tr><td>tubulão 21</td><td>5,76</td><td>0,69</td></tr><tr><td>tubulão 10</td><td>5,76</td><td>1,38</td></tr><tr><td>Total</td><td>82,56</td><td>21,56</td></tr></tbody></table> Valor total = 82,56 + 21,56 = 104,12 m3 Observação: Projeto 1242-EST-PE-LIB-051-PLA-FUND-R00				Peca	Volume escavado	Abertura de Bases	tubulão 1	5,76	0,19	tubulão 2	5,76	0,89	tubulão 5	5,76	3,99	tubulão 7	5,76	1,93	tubulão 8	7,68	4,75	tubulão 11	5,76	3,48	tubulão 12	5,76	0,89	tubulão 14	5,76	1,12	tubulão 15	5,76	0,06	tubulão 20-A	5,76	0,89	tubulão 20-B	5,76	0,89	tubulão 22	5,76	0,41	tubulão 21	5,76	0,69	tubulão 10	5,76	1,38	Total	82,56	21,56
Peca	Volume escavado	Abertura de Bases																																																	
tubulão 1	5,76	0,19																																																	
tubulão 2	5,76	0,89																																																	
tubulão 5	5,76	3,99																																																	
tubulão 7	5,76	1,93																																																	
tubulão 8	7,68	4,75																																																	
tubulão 11	5,76	3,48																																																	
tubulão 12	5,76	0,89																																																	
tubulão 14	5,76	1,12																																																	
tubulão 15	5,76	0,06																																																	
tubulão 20-A	5,76	0,89																																																	
tubulão 20-B	5,76	0,89																																																	
tubulão 22	5,76	0,41																																																	
tubulão 21	5,76	0,69																																																	
tubulão 10	5,76	1,38																																																	
Total	82,56	21,56																																																	
TOTAL: 104,12																																																			
OBSERVAÇÃO																																																			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023																																																			
CONTRATO Nº 001/2023																																																			
VISTO/DATA 20/03/2024																																																			
CONSTRUTORA PROHIDRO																																																			
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS																																																			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916																																																			

Raphael Pizzol
Coordenador
Imagemada na Santa Casa de
Milaerodria de Sorocaba

Raphael Pizzol
Coordenador
Imagemada na Santa Casa de
Milaerodria de Sorocaba

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
4.FUNDAÇÕES PROFUNDAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
4	Armadura de aço CA50/60	KG	
PLANILHA			
4.5			
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	TOTAL
1	Armadura de aço CA50/60	18/12/23 à 20/03/24	3.134,20

Peca	quantidade	aço (kg)	medição
tubulão 8	1	205,5213115	205,521311
tubulão 1	1	154,1409836	154,140984
tubulão 2	1	154,1409836	154,140984
tubulão 3	1	154,1409836	154,140984
tubulão 4	1	154,1409836	154,140984
tubulão 5	1	154,1409836	154,140984
tubulão 6	1	154,1409836	154,140984
tubulão 7	1	154,1409836	154,140984
tubulão 9	1	154,1409836	154,140984
tubulão 10	1	154,1409836	154,140984
tubulão 11	1	154,1409836	154,140984
tubulão 12	1	154,1409836	154,140984
tubulão 13	1	154,1409836	154,140984
tubulão 14	1	154,1409836	154,140984
tubulão 15	1	154,1409836	154,140984
tubulão 16	1	154,1409836	154,140984
tubulão 17	1	154,1409836	154,140984
tubulão 18	1	154,1409836	154,140984
tubulão 19	1	154,1409836	154,140984
tubulão 20	1	154,1409836	154,140984
tubulão 17	0	154,1409836	0
tubulão 18	0	154,1409836	0
tubulão 19	0	154,1409836	0
tubulão 23	0	154,1409836	0
tubulão 24	0	154,1409836	0
tubulão 25	0	154,1409836	0
Total			3134,2

Tubulões fora do escopo

CONVÊNIO - 122/2022
 Investimento na Construção e Reforma
 de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UGE pagadora: 090196
 Grupo de Despesa: 445042

OBSERVAÇÃO		TOTAL: 3.134,20	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023		KG	
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA	
CONSTRUTORA PROHIDRO		FISCALIZAÇÃO	
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			

 MEMÓRIA DE CALCULO Comercial e Construtora Prohidro LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20		PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916 CONCORRENCIA Nº 001/2023	
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA			
4.FUNDAÇÕES PROFUNDAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	
4	Remoção do solo removido	M3	
PLANILHA			
4.7			
ITEM	DESCRIPTIVO	PERÍODO	TOTAL
1	Remoção do solo removido	18/12/23 à 20/03/24	113,53

volume escavado e removido corresponde a 70% do total da obra
 162,18 m³ x 70% = 113,53m³

70%

OBSERVAÇÃO		TOTAL: 113,53	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023		M3	
CONTRATO Nº 001/2023			
VISTO/DATA 20/03/2024		VISTO/DATA	
CONSTRUTORA PROHIDRO		FISCALIZAÇÃO	
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS			
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916			

grupo de despesas: 445042
 UGE pagadora: 090196
 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 99 de 9902 Oncológicos
 investimento na construção e reforma
 CONVÊNIO - 122/2022

Imatidade de Santa Casa de
 Misericórdia de São Paulo

Imatidade de Santa Casa de
 Misericórdia de São Paulo

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

MEMÓRIA DE CÁLCULO Comercial e Construtora Prohido LTDA CNPJ : 59.734.921/0001-20	PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916
	CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE ONCOLOGIA

5. INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS BALDRAMES		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE
5		
PLANILHA		
5.7	Armadura de aço CA50/60	KG

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	KG	TOTAL
1	Armadura de aço CA50/60	18/12/23 à 20/03/24	1.724,80	1.724,80

PROHIDO
 Construtora

Pedido de Contrato: 20122
 Data: 24/03/2024 13:30
 Página: 1 de 1

Objeto: Santa Casa - Prédio Oncologia
 C. do Contrat: Despesas Suprimentos e Serviços Diversos

Período: 18/12/23 à 20/03/24

Fornecedor:
 MANETONI DISTR. DE PRODUTOS S/D IMP E EXP LTDA
 R. CORNELIO FUREZ SP 127 03443-5
 Fone: 2193922150 Fax: 42.5 Piracicaba SP 13421-820
 Nome do Contato: SOLARA

Condição de Pagamento: Data de início do request:

Dados Para Fatura / NF/Recibo:
 Comercial e Construtora PROHIDO S/A
 CNPJ/CPF: 59.734.921/0001-20
 João Marcelo 200
 Fone: 19333-9544 Fax: 19333-9544
 Insc. Est: 069.979.005-19
 Sonechato SP 13095-010

Entrega de Material:
 Avenida São Paulo 700
 Fone: 16913-000 Fax: 16913-000

Serviço cobrado por:
 Avenida São Paulo 700
 Fone: 16913-000 Fax: 16913-000

Serviço do contrato:

Item	Serviço do Contrato	P.S.	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	ACO - FUNDAÇÃO	363.23.24	1.300	V/B	25.072,40	26.573,80
5	ACO - BLOCOS	268.54.27	1.800	V/B	3.001,11	5.401,11

Retenções:
 INSS: 0,00% R\$ 0,00 IRAP: 0,00% R\$ 0,00
 ISS: 0,00% R\$ 0,00 Caução: 0,00% R\$ 0,00
 Pá/Café/Cel: 0,00% R\$ 0,00 Ciel: 0,00% R\$ 0,00
Total do contrato: R\$ 28.974,91

OBSERVAÇÃO:
 Informamos que os pagamentos somente ocorrerão nos dias 10 / 20 / 30 de mês com pagamento efetivo no mesmo 10 dias da data de emissão da nota. Todos faturas de serviço e materiais deverão ser emitidos até o dia 20 de cada mês em virtude do fechamento mensal mensal.
 Nota fiscal e fatura que não seguem essa regra serão canceladas.
 1 - Desatualizar o preço da Nota Fiscal se dados do contrato.
 2 - Pagar tempestivamente - verado o desconto e ao repagamento de faturas dos valores dentro curvas.

APROVAÇÃO: Belio
 Comercial e Construtora PROHIDO S/A

FORNECEDOR

O valor do contrato de R\$ 28.074,71 reais, corresponde a compra de 4.859 kg de aço.

Conforme pedido nº 20122, o valor correspondente dos tubulões é 3134,20 (conforme memória de cálculo item 4.5) e o valor correspondente do aço dos blocos é de 1724,8 kg, conforme projetos - 1242-EST-PE-LIB-020-ARM-BLOC-R00 e 1242-EST-PE-LIB-021-ARM-BLOC-R00 (folha 1 e 2)

Logo unidade	Relatório fotográfico de acompanhamento de medições	Processo nº	Convênio nº	Medição nº
				2

Dados do Convênio		Áreas (m2)	
Conveniado:	Comercial e Construtora Prohido LTDA	Terreno	2.223,00
Objeto:	Construção e reforma do prédio de oncologia	Existente	
Endereço:	Rua João Mercado, 260 Vila Santana, Sorocaba - SP, 18095-010	Reforma	
Contato:	(15) 3331-8484 - Pedro Henrique Fermino	A construir	

Foto 1 - Refeitório finalizado

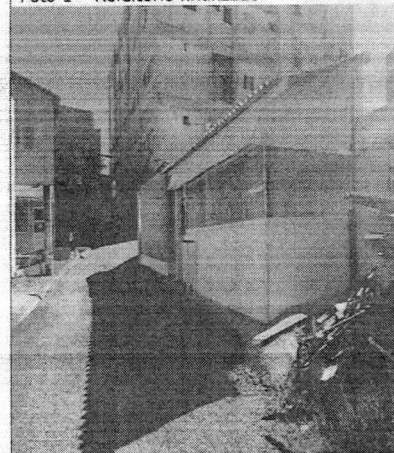


Foto 2 - Refeitório finalizado



Foto 3 - Fechamento de tapume para isolamento da área

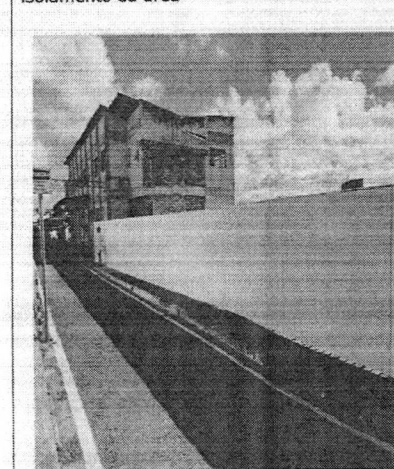


Foto 4 - Acompanhamento topográfico para marcação de eixos e locação dos tubulões



OBSERVAÇÃO	TOTAL:	KG
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023		
CONTRATO Nº 001/2023		
VISTO/ DATA 20/03/2024		
CONSTRUTORA PROHIDO		
ENG PÉRSIO ANTONIO DOS SANTOS		
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/001916		

VISTO/ DATA

FISCALIZAÇÃO

Raphael Pizzol
 Gerente Geral
 Gerente Geral da Santa Casa de Sorocaba

Tullb.

1/11

Foto 5 – Acompanhamento topográfico para
marcação de eixos e locação dos tubulões



Foto 6 – Início da escavação dos tubulões

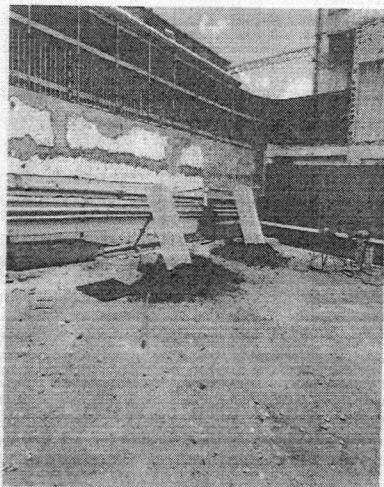


Foto 7 – Continuação da escavação dos
tubulões


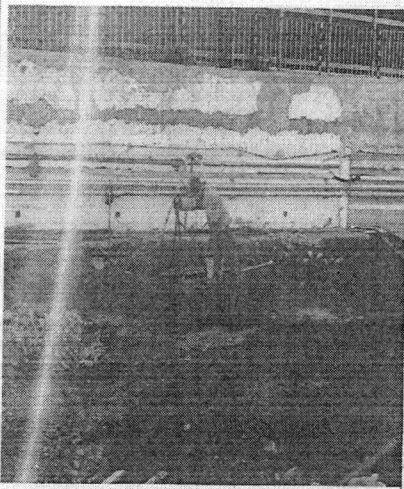


Foto 8 – Continuação da escavação dos tubulões

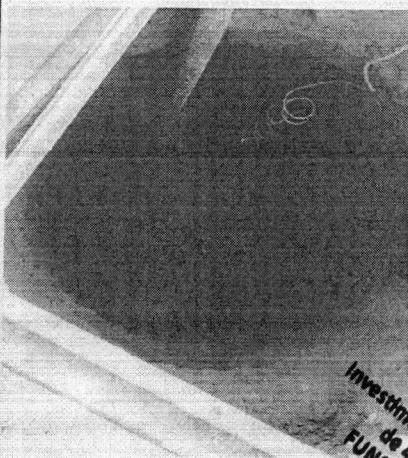

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGF pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 443042

Foto 9 – Continuação da escavação dos
tubulões.



Foto 10 – Continuação da escavação dos tubulões.



Foto 11 – Continuação da escavação dos
tubulões.



Foto 12 – Continuação da escavação dos tubulões.



CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGF pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 443042

7.11.6.

11/11/2022

7.11.6.

11/11/2022

CONVÊNIO - 122/2022
 Investimento na Construção e Reforma
 de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UGE nº 090196
 Grupo de Ocorrência: 44.4042

Foto 13 - Continuação da escavação dos



Foto 14 - Continuação da escavação dos tubulões



Foto 15 - Continuação da escavação dos tubulões



Foto 16 - Continuação da escavação dos tubulões

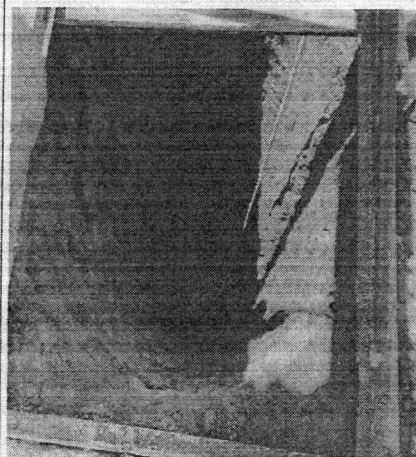


Foto 17 - Continuação da escavação dos tubulões



Foto 18 - Continuação da escavação dos tubulões

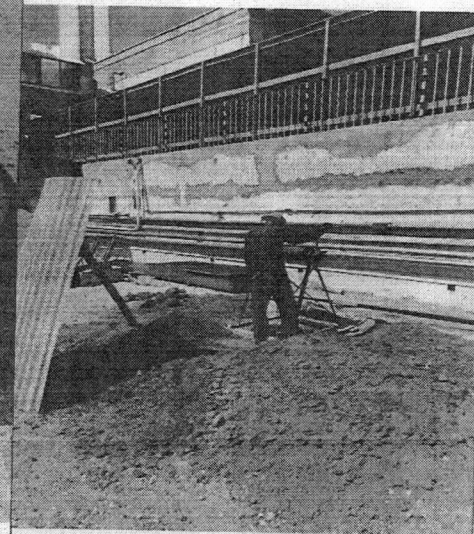


Foto 19 - Demolição do piso existente


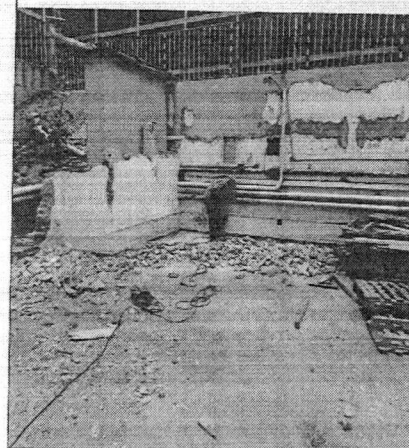


Foto 20 - Remoção do solo removido dos tubulões

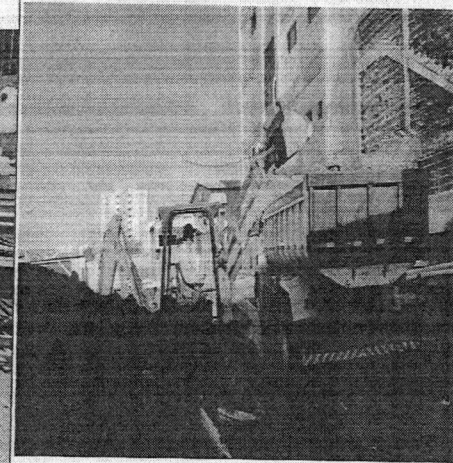

7.11.2022

7.11.2022

Foto 21 - Demolição do piso existente

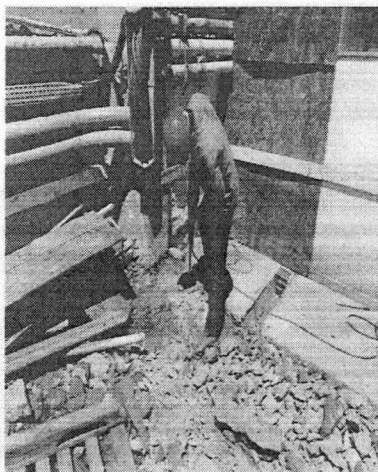


Foto 22 - Remoção do solo removido dos tubulões



Foto 23 - Organização das ferramentas

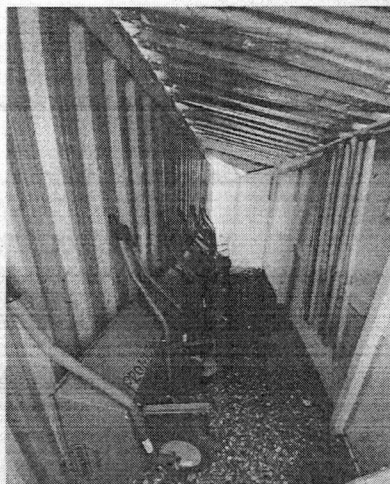


Foto 24 - Continuação da escavação dos tubulões



Foto 25 - Remoção de entulho



Foto 26 - Utilização de PTA para correção de tubulação hidráulica danificada

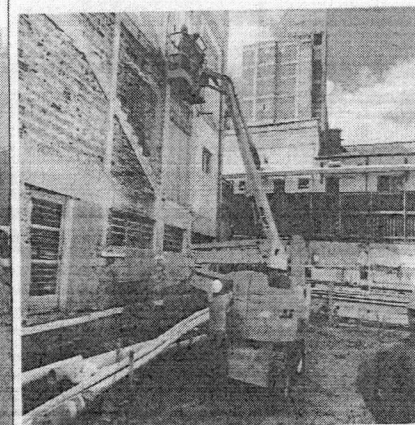


Foto 27 - Utilização de PTA para correção de tubulação hidráulica danificada

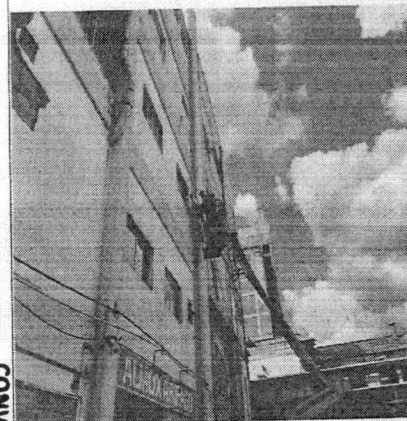


Foto 28 - Utilização de PTA para correção de tubulação hidráulica danificada



Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGF pagadora: 090136
Grupo de Despesa: 445042
CONVÊNIO - 122/2022

Tullio.

Tullio.

Foto 29 - Continuação da escavação dos tubulões.




Foto 30 - Continuação da escavação dos tubulões.



Foto 31 - Continuação da escavação dos tubulões.



Foto 32 - Continuação da escavação dos tubulões.

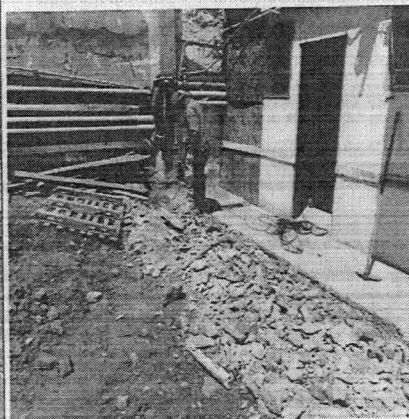

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
USF pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

Tub.
