

PLANO DE TRABALHO

PA 14445/2024 – Emendas Parlamentares Municipais n.º 1, 65, 190, 254, 407, 518 e 739 e 363/2024 – Investimento - para obras da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE.....	4
OBJETO A SER EXECUTADO	4
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA	13
PUBLICO ALVO	13
ESTRUTURA FÍSICA.....	6
AÇÕES INDISPENSÁVEIS.....	7
METAS A SEREM ATINGIDAS	7
RECURSOS HUMANOS	7
RECURSOS MATERIAIS.....	7
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	15
ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO.....	8
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE.....	8
OBJETIVOS GERAIS.....	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	9
VALOR DA PROPOSTA	9
PLANO DE APLICAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	9
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUÇÃO DO OBJETO.....	9
ANEXO.....	9



IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL	
NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintendente Executivo
RG	4.3.███-9
CPF	434.███8-68
Data de Nascimento	███/1946
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, raça, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:


- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e Região e suas instalações não atendem na íntegra as exigências das normas técnicas e de funcionamento vigentes como a RDC 50 de 2002, a RDC 63 de 2011, a ABNT NBR 135342-008; a NBR 12188-2016, a NBR ISSO 16651-2019. Tal cenário desencadeou desde o ano de 2019 a execução de diversos projetos de reformas, manutenções e adequações de infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização, pintura, revestimentos etc.

1. Bloco São Miguel (antigo Bloco A)


BLOCO SÃO MIGUEL

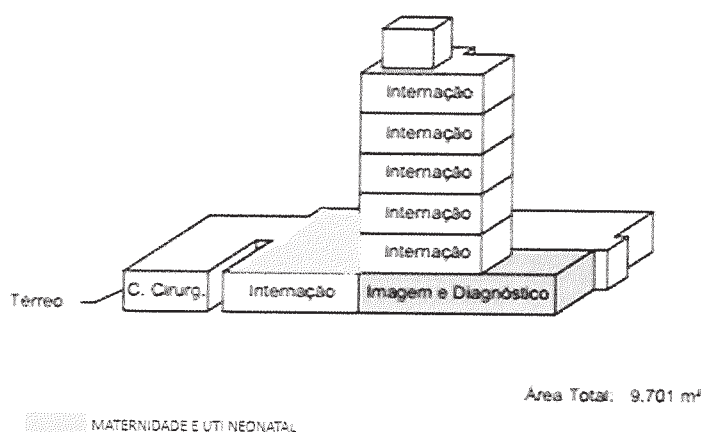

Atualmente a área destinada a maternidade e a UTI Neonatal sofre com a precariedade das instalações, necessitando de adequações, substituições e reparos elétricos, hidráulicos, de forro, de pintura, de revestimentos. Apresenta risco de incêndio, vazamentos, as superfícies não favorecem a correta higienização e ambiência preconizada na PNH, normas de segurança e não possibilitam a obtenção de AVCB. A regularização das instalações previstas no presente Plano de Trabalho de 208,80 m² perante a RDC 50 e normas técnicas de segurança, viabilizarão a obtenção das Licenças e Alvarás para o regular. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, está inserida na rede de atendimento à Gestante e ao Recem Nascido, atendendo às pacientes de baixo e médio risco do município de Sorocaba, conforme pactuação pré estabelecida nesta rede. Na obstetrícia, o atendimento é porta aberta para parto e intercorrência relacionada a gestação, garantindo o acesso em tempo oportuno à gestante.

O Bloco São Miguel conta ainda com cinco pavimentos inacabados, que gradualmente estão sendo replanejados, projetados e concluídos enquanto área de internação e para tanto faz-se necessário a elaboração de projetos executivos de climatização, hidráulica e elétrica.


UTI NEONATAL

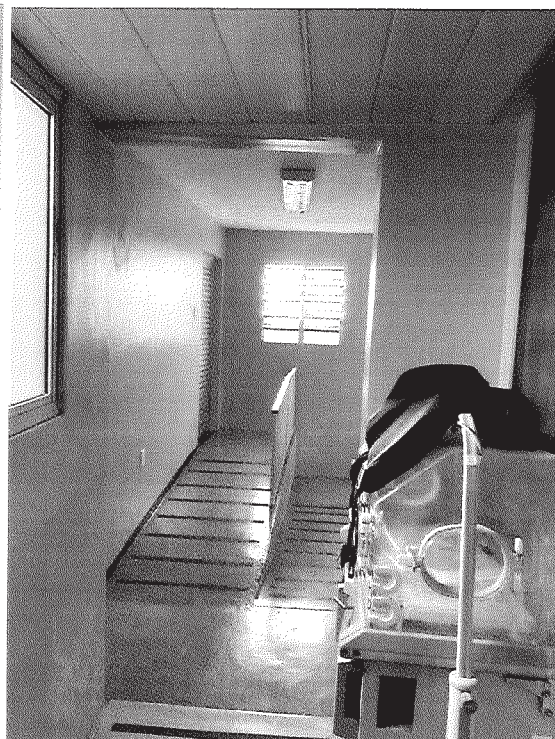

Bloco São Camilo (antigo Bloco B)

Conta com uma área de 7.070,00 m² e abrigará em seus pavimentos conforme layout abaixo leitos de internação, apoio técnico, administrativo e operacional:


BLOCO SÃO CAMILO




Área Total: 7.070 m²


A Cozinha - Setor de Nutrição e Dietética, instalada atualmente no Bloco São Miguel, numa edificação antiga, requer espaço adequado, compatível com as tecnologias modernas para servir 1.100 refeições diariamente. A nova cozinha que se encontra em fase final de reforma será instalada no Bloco São Camilo e não dispõe dos materiais necessários para a climatização dos ambientes, que além de conferir conforto térmico qualificará o tratamento do ar, reduzindo os riscos biológicos e químicos transmissíveis e tem a função de eliminar gorduras, vapores e odores, conforme previsto na legislação vigente e essencial para o bom funcionamento da cozinha. Estão em trâmite a formalização de instrumentos para a aquisição dos equipamentos através do PA 11.316/2024 e mão de obra no PA 13.709/2024.

COZINHA ATUAL

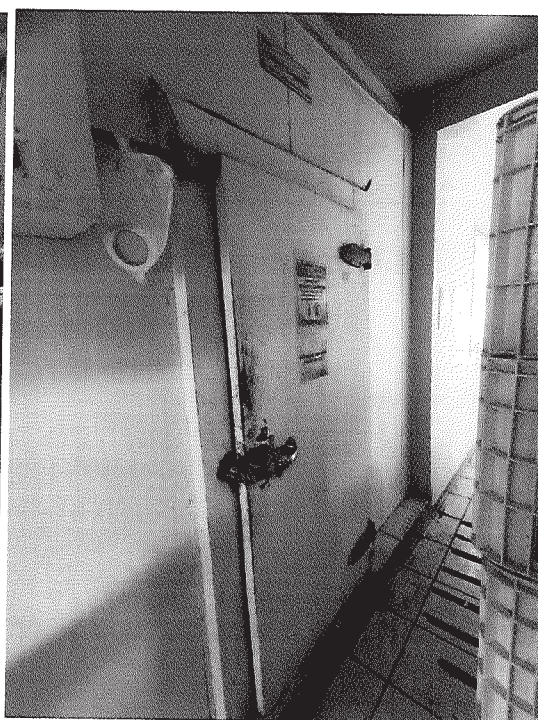

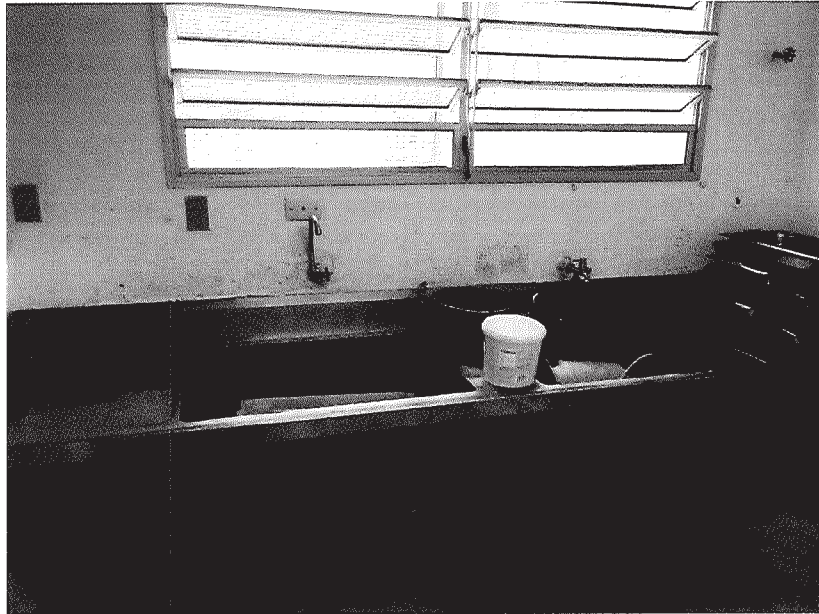

NOVA COZINHA

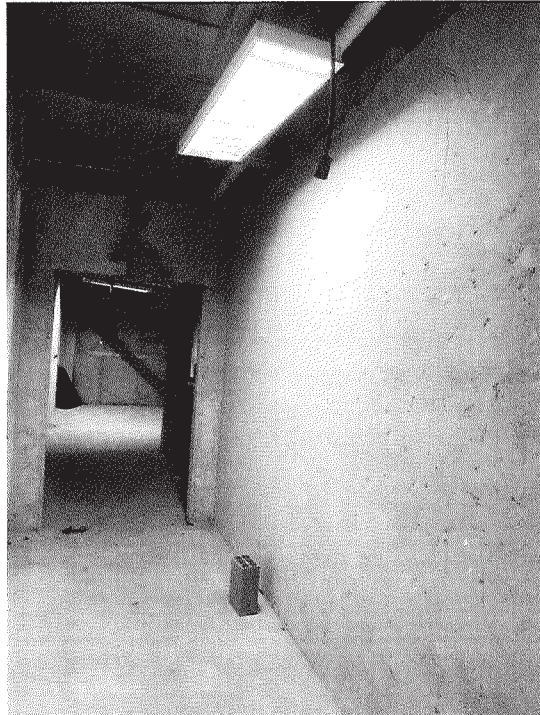



Ressalta – se que a área total do bloco São Camilo, local onde será instalada a nova cozinha, é de 7070m², sendo que 548m² refere – se a estrutura física da nova cozinha, local ao qual será instalado o sistema de climatização.

2. O Bloco São José (antigo casarão)

Conta com uma área de 382 m² e abrigará em seus dois pavimentos área de apoio administrativo , conforme layout abaixo:


BLOCO SÃO JOSÉ




Área Total: 382 m²

Abaixo segue a situação atual do prédio denominado Bloco São José, demonstrando a necessidade de manutenções e reparos. Parte do material para essa reforma consta no PA 11.597.


- Fachada com a parede irregular, esburacada, ligações hidráulicas inadequadas, pintura descascada.

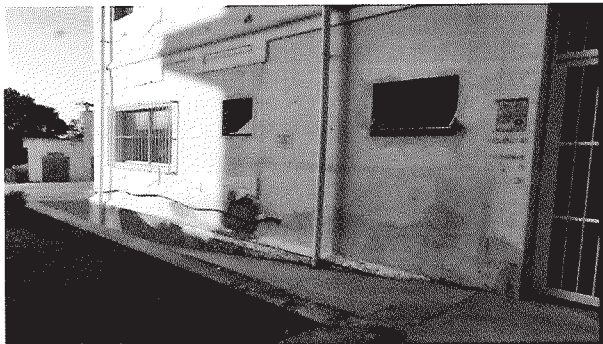


- Forro de madeira muito antigo com cupim

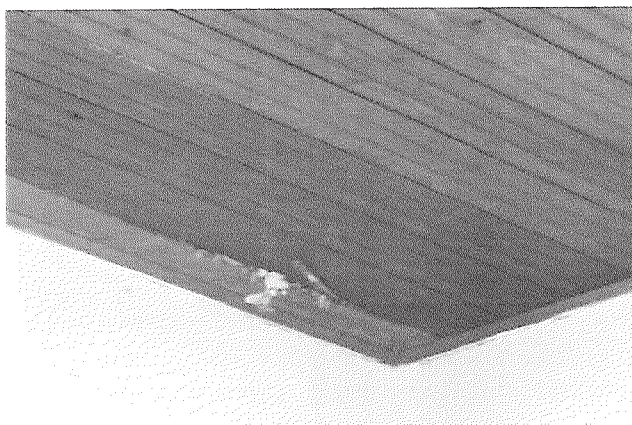

- Paredes internas com irregularidades, sujas e descascadas

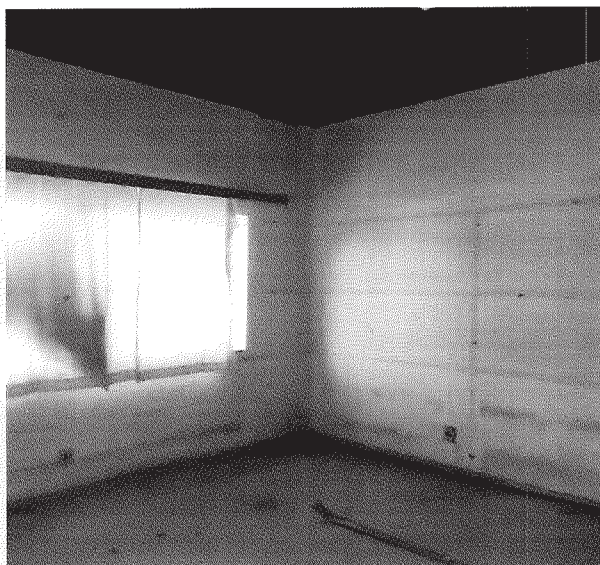


- Instalações hidráulicas e pisos irregulares e inadequados

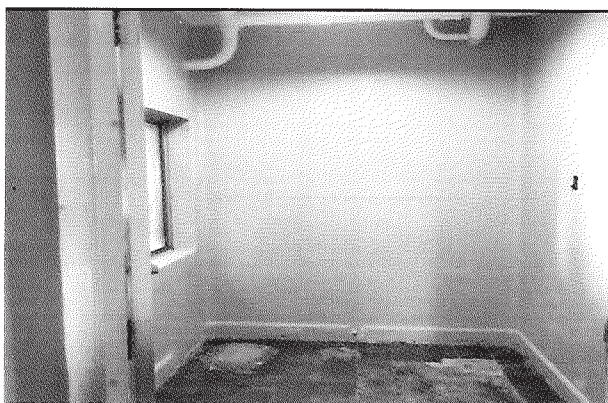

3. Bloco Saúde Mental

Atualmente a área destinada ao setor de Saúde Mental na Santa Casa de Sorocaba não possibilita ofertar o cuidado de que trata o inciso I do artigo 10 da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011(*) que deve estar articulado com o Projeto Terapêutico Individual e a internação de curta duração até a estabilidade clínica do paciente, encontra-se em local com espaço limitado além de não atender a requisitos das normas técnicas e de segurança para funcionamento de estabelecimento de saúde.



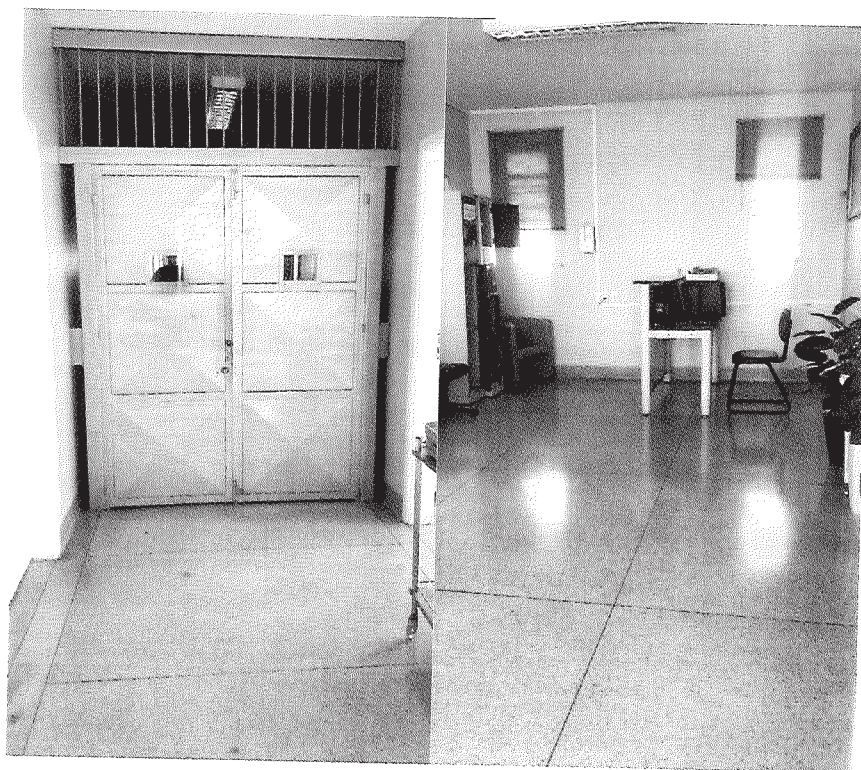

O Bloco da saúde mental passará por reforma em toda sua estrutura física, conforme indicado em projetos e planilhas orçamentárias. A reforma, em resumo, será no forro, colocação de esquadrias e nas paredes.

OBJETO A SER EXECUTADO

Custeio - prestação de serviço especializado e material para reformas.

Bloco São Miguel:

- Fornecimento de material e mão de obra para reforma da UTI Neonatal;
- Elaboração de projetos de climatização, elétrica e hidráulica para a conclusão dos pavimentos inacabados.

Bloco São Camilo:

- Fornecimento de material (grelhas, dutos, difusores, filtro, tubos espuma elastomérica, válvulas, manta de isolamento térmico, venezianas) para a obra de instalação de sistema de ar-condicionado para área de cocção da cozinha hospitalar no total de 548 m². Ressalta-se que a compra dos equipamentos (fancoil, fancolete, exaustores, caixas de ventilação, coifas) encontra-se no processo 11.316/2024 por ambos serem de natureza de despesa distintas.

Bloco São José:

- Fornecimento de mão de obra e material para regularização e pintura das paredes, mão de obra para substituição de forro; substituição de instalações hidráulicas; substituição de piso;

Bloco Saúde Mental:

- Fornecimento de material e mão de obra para a obra de reforma da área 183,57 m² para abrigar novo espaço de atendimento da Saúde Mental.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a execução será cotação prévia de 03 orçamentos:

1. Desmobilização das áreas assistenciais e administrativas a serem adequadas, sendo que a instituição remaneja para outras áreas sem prejuízo ao atendimento prestado;
2. Mediante programação de adequações e de manutenção, a gerência predial e setor de engenharia solicita orçamentos junto a empresas especializadas no mercado (mapas de cotação anexos);
3. Analisa as propostas/orçamentos recebidos.
4. Após avaliação do engenheiro da Instituição responsável pela manutenção predial, a equipe técnica selecionará o menor preço, melhor técnica e melhor custo-benefício, seleciona a empresa e inicia a execução.
5. Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Projetos Arquitetônico nos moldes previstos nas Legislações pertinentes, quando for o caso.
6. A prestação de serviços seguirá de acordo com a Lei 6.496/77 (ART).

PUBLICO ALVO

A população direta a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento serão os usuários SUS e funcionários da Instituição da Maternidade e UTI neonatal, da cozinha, do laboratório, do prédio administrativo e da saúde mental

ESTRUTURA FÍSICA

Instalações físicas objeto:

- ✓ UTI Neonatal– layout no item Descrição da Realidade
- ✓ Cozinha hospitalar- layout no item Descrição da Realidade
- ✓ Prédio Administrativo - layout no item Descrição da Realidade;
- ✓ Saúde Mental - layout no item Descrição da Realidade;
- ✓ Bloco São Miguel – pavimentos inacabados

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

1. Dispor dos projetos e registros conforme a legislação vigente e de Responsabilidade Técnica
2. Realizar Cotação Prévia De Preços;
3. Contratar empresa especializada para execução dos serviços;
4. Monitorar o cumprimento do contrato.
5. Prestar Contas

METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativa: Reformar 208,8 m² da UTI neonatal na maternidade.

Ações para Alcance: Aquisição de prestação de serviços especializado de obras hospitalares.

Situação Atual: UTI Neonatal não atende o Título IV, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017

Situação Pretendida: UTI Neonatal atendendo o Título IV, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017

Indicador de Resultado: 208,8 m² de área da UTI neonatal de acordo com os critérios de habilitação do Título IV, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017

Fórmula de Cálculo do Indicador:

- m² de área adequada para habilitação de acordo com o Título IV, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017 da UTI Neonatal posterior a reforma/ m² previstos para adequação de acordo com o Título IV, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017 de UTI Neonatal x 100.

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia e Relatório Fotográfico

Meta Quantitativa: Climatizar integrando com a Central de Água Gelada 548 m² de área de cozinha hospitalar do Bloco São Camilo;

Ações para Alcance: Aquisição de prestação de serviços especializado de climatização.

Situação Atual: Cozinha hospitalar sem climatização indicada para uso hospitalar que deve atender a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021 para serviços de saúde.

Situação Pretendida: Cozinha hospitalar com climatização indicada para uso hospitalar que deve atender a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021 para serviços de saúde.

Indicador de Resultado: Total da área climatizada no Bloco São Camilo pela CAG

Fórmula de Cálculo do Indicador: 548 m² de área climatizada pela CAG posterior a reforma/ 548 m² de área climatizada pela CAG anterior a reforma climatização CAG x100

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

Meta Quantitativa: Reformar 382 m² do prédio do antigo casarão (Bloco São José) para abrigar a área de gerenciamento administrativo da Santa Casa de Sorocaba

Periodicidade de Monitoramento: Trimestral

Ações para Alcance: Adquirir mão de obra e material para substituir as instalações elétricas, manutenção em civil e pintura interna e da fachada do prédio do antigo casarão.

Situação Atual: Prédio com instalações elétricas, civil e pinturas em péssimas condições de uso

Situação Pretendida: Adequar as instalações elétricas, civil e pintura, proporcionando ambiente adequado e de acordo com as normas técnicas estabelecidas,

Resultado Relatório Técnico do setor de engenharia e Relatório fotográfico

Meta Quantitativa: Adequar 183,57 m² de área para abrigar o novo setor de Saúde Mental;

Ações para Alcance: Aquisição de prestação de serviços especializado de obras hospitalares.

Situação Atual: Espaço que abriga o atendimento em saúde mental no hospital não possibilita o atendimento preconizado na Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011(.).

Situação Pretendida: Espaço que abriga o atendimento em saúde mental no hospital atendendo o preconizado na Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011(.).

Indicador de Resultado: Total de área reformada para abrigar o atendimento de Saúde mental do Hospital.

Fórmula de Cálculo do Indicador: 183,57 m² de área adequada para atendimento da Saúde Mental posterior a reforma/ 183,57 m² de área adequada para atendimento da Saúde Mental anterior a reforma x100

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia Relatório Fotográfico e da Engenharia

Meta Qualitativa: Aumentar o nível de satisfação dos usuários referente às instalações físicas no Bloco São Camilo, Bloco São Miguel, Bloco São José e Bloco da Saúde Mental;

Ações para Alcance: Instalação de climatização adequada na cozinha, reforma da UTI neonatal, do prédio administrativo e da saúde mental.

Situação Atual: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre com 80% entre ótimo e bom.

Situação Pretendida: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre superior a 80% entre ótimo e bom.

Indicador de Resultado: Relatório de Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas.

Fórmula de Cálculo do Indicador: Percentual de satisfação referente às instalações físicas antes das reformas/percentual de satisfação referente às instalações físicas após a reforma x 100

Fonte do Indicador: Ouvidoria

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação direta de Recursos Humanos, tendo em vista que o Plano de Trabalho tem como objeto contratação de prestação de serviço.

RECURSOS MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade da contratada o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto.

Ficará sob responsabilidade da Instituição fiscalizar a contratada referente a execução e atendimento ao escopo.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará através:

1. Projeto: Pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
2. Execução da Emenda: pela Secretaria da Saúde que poderá designar outros membros para auxiliá-los no exercício da fiscalização;
3. Através do envio dos relatórios de metas qualitativas e quantitativas, memorial de atividade e relatórios com fotos. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como a fiscalização in loco, quase a Secretaria da Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Fase 1	Seleção de empresas para fornecimento da prestação de serviços	15 dias
Fase 2	Execução dos serviços conforme cronograma de desembolso / Acompanhamento das metas e indicadores	195 dias
Fase 3	Realizar fiscalização/ vistoria ao final de cada etapa de execução, elencadas no cronograma de prestação de serviços	Conforme estipulado no cronograma
Fase 4	Emissão de relatórios de prestação de contas referente a execução do projeto e da parte financeira	Mensal e após 30 dias do último mês de execução.
Fase 5	Emissão de relatórios de prestação de contas. Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas	Trimestral e ao final da execução

CRONOGRAMA DE ANDAMENTO DA OBRA REFERENTE A FASE DE EXECUÇÃO – FASE 02.

- Instalação de Climatização da cozinha no Bloco São Camilo → 1 a 30 dias

- Reforma de Bloco São José
 - Piso Térreo (material e mão de obra) → 1 a 30 dias
 - Piso Superior (material e mão de obra) → 31 a 60 dias
- Reforma da UTI Neonatal localizada no Bloco São Miguel.

Descrição detalhada dos serviços no Bloco São Miguel.

01 a 30 dias = demolição de alvenaria, remoção de chapas de Dry Wall, construção da nova alvenaria e colocação chapisco, emboço e reboco.

31 dias a 60 dias = sistema de impermeabilização – instalação hidráulica e elétrica

61 dias a 90 dias = tratamento no forro e cobertura

91 dias a 120 dias = colocação de esquadrias

121 dias a 150 dias = Colocação dos acessórios

151 dias a 180 dias = Pinturas

181 dias a 195 dias = Instalações para AVCB e proteções contra incêndio e limpeza geral.

- Reforma da Saúde Mental

01 a 30 dias = retirada do forro e inserção do novo forro. (Gesso Acartonado).

31 dias a 60 dias = Aplicação do selador, tinta látex acrílica e texturizada (de acordo com projetos), colocação de piso vinílico.

61 dias a 90 dias = revestimento em paredes e colocação de porcelanato em ambientes definidos em projetos.

91 dias a 120 dias = instalação de esquadrias (janelas e portas) e limpeza geral

- Reforma do Bloco São Miguel: Elaboração de Projetos. (30 dias).

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade terão como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

OBJETIVOS GERAIS

- Atender às normas técnicas de funcionamento e de segurança em estabelecimentos de Saúde, no que se refere a UTI Neonatal, Serviço de Nutrição e Dietética - SND, Apoio Administrativo e Enfermaria de Saúde Mental e normas assistenciais para a área de Saúde Mental e Materno Infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Qualificar o tratamento do ar no SND;
2. Conforto térmico com a finalidade de garantia da temperatura adequada ao ambiente no SND;
3. Manter os níveis adequados da umidade do ar no SND;
4. Humanizar o ambiente assistencial na Saúde Mental e na UTI Neonatal;
5. Reduzir riscos de infecção em todas as áreas reformadas;
6. Facilitar a higienização dos ambientes reformados;

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio São Miguel, São Camilo, São José e Saúde Mental – Santa Casa de Sorocaba Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP

VALOR DA PROPOSTA

R\$2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), referente as emendas parlamentares:

nº 1 de R\$ 1.000.000,00, n.º 65 de R\$ 200.000,00, n.º 190 de R\$ 200.000,00, n.º 254 de R\$ 200.000,00, n.º 407 de R\$ 100.000,00, n.º 518 de R\$ 450.000,00, n.º 739 de R\$ 300.000,00 n.º 363 de R\$ 100.000,00.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio	Prestação de Serviço, Material e Mão de obra	R\$ 2.550.618,49	R\$ 618,49	0,02	R\$ 2.550.000,00	99,98
Total			R\$ 2.550.618,49	R\$ 618,49	0,02	R\$ 2.550.000,00	99,98

O valor de R\$ 618,49 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) será custeado pela entidade (contrapartida).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Valor	%	Concedente	%	Proponente	%	Total de Desembolso
1 (1ª Parcela)	R\$ 975.178,60	100	R\$ 975.178,60	100	R\$ 0,00	0	R\$ 975.178,60
2 (2ª Parcela)	R\$ 435.435,77	100	R\$ 435.435,77	100	R\$ 0,00	0	R\$ 435.435,77
3 (3ª Parcela)	R\$ 591.257,37	100	R\$ 591.257,37	100	R\$ 0,00	0	R\$ 591.257,37
4 (4ª Parcela)	R\$ 199.273,98	100	R\$ 199.273,98	100	R\$ 0,00	0	R\$ 199.273,98
5 (5ª parcela)	R\$ 110.640,87	100	R\$ 110.640,87	100	R\$ 0,00	0	R\$ 110.640,87
6 (6ª parcela)	R\$ 235.653,18	100	R\$ 235.653,18	100	R\$ 0,00	0	R\$ 235.653,18
7 (7ª parcela)	R\$ 3.178,72	100	R\$ 2.560,23	80,5	R\$ 618,49	19,5	R\$ 3.178,72
Total	R\$ 2.550.618,49	100	R\$ 2.550.000,00	99,98	R\$ 381,14	0,02	R\$ 2.550.618,49

CRONOGRAMA DESEMBOLSO DETALHADO

Nº	ITEM	TIPO DE AQUISIÇÃO	DESEMBOLSO							TOTAL
			FASE 1 MÊS 01 - 1 a 30 dias	FASE 2 MÊS 02 31 a 60 dias	FASE 3 MÊS 03 61 a 90 dias	FASE 4 MÊS 04 92 a 120 dias	FASE 5 MÊS 05 121 a 150 dias	FASE 6 MÊS 06 151 a 180 dias	FASE 7 MÊS 07 181 a 195 dias	
1	Instalação climatização Cozinha	Material	R\$ 250.000,00							R\$ 250.000,00
2	Reforma Bloco São José - prédio administrativo	Mão de Obra	R\$ 44.188,80	R\$ 42.419,65						R\$ 86.608,45
		Material	R\$ 9.296,90							R\$ 9.296,90
3	Reforma UTI Neonatal	Material e Mão de Obra	R\$ 472.914,43	R\$ 169.406,36	R\$ 248.623,17	R\$ 196.273,98	R\$ 110.640,87	R\$ 235.653,18	R\$ 3.178,72	R\$ 1.436.690,71
4	Reforma Saúde Mental	Material e Mão de Obra	R\$ 98.541,12	R\$ 223.609,76	R\$ 342.634,20	R\$ 3.000,00				R\$ 667.785,08
5	Reforma Blocos São Miguel	Elaboração de Projetos	R\$ 100.237,35							R\$ 100.237,35
TOTAL GERAL			R\$ 975.178,60	R\$ 435.435,77	R\$ 591.257,37	R\$ 199.273,98	R\$ 110.640,87	R\$ 235.653,18	R\$ 3.178,72	R\$ 2.550.618,49



PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A partir da assinatura por 7 meses.

ANEXO

Orçamentos

Sorocaba, 19 de setembro de 2024.

REINALDO
BESERRA
DOS
REIS:4
615868

Assinado digitalmente por
BESERRA DOS REIS:4
ID: C-8R, O-ICP-Brasil
OU-09125942000144, O-ICP-Brasil
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-
RFB e-CP (em branco), CN-
REINALDO DOS REIS:4
REIS:4
Data: 2024.09.19 15:55:13-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 10.1.2

Reinaldo Beserra dos reis
Superintendente Executivo
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
